BUKO. HUISVESTING

Concept planning M.F.C. Aardenburg.

ID	Taaknaam	Verantw	Duration	Start
1				
2				
3	Opdrachtverstrekking		**434 days**	**Fri 16-10-20**
4	Defenitieve opdracht	Opdrg	0 days	Fri 16-10-20
5	project start up bijeenkomst	Buko	0 days	Mon 19-10-20
6	contractoverleg 1 x per 3 weken	Buko	432 days	Tue 20-10-20
7	Gebruikersoverleg 1	BUKO	1 day	Wed 4-11-20
8	Gebruikersoverleg 2	BUKO	1 day	Wed 25-11-20
9	Projecteam vergaderingen 1 x per 4 weken	Buko	360 days	Tue 8-12-20
10				
11	Ontwerptraject VO naar UO		**99 days**	**Tue 20-10-20**
12	Bankgarantie	Buko	1 day	Mon 15-3-21
13	Verzekeringspolis	Buko	6 days	Tue 3-11-20
14	Termijnstaat	Buko	1 day	Tue 3-11-20
15	uitwerken VO tot DO	Buko	25 days	Tue 20-10-20
16	Verificatie ontwerp DO	opdrg	10 days	Tue 24-11-20
17	Accoord verrificatie opdrachtgever DO	opdrg	0 days	Mon 7-12-20
18	Uiterste wijzigingsdatum buitengevels en constructie door opdrachtgever	opdrg	0 days	Tue 24-11-20
19	uitwerken DO naar UO	Buko	30 days	Tue 8-12-20
20	uiterste wijzigingsdatum binnenwanden en indeling door opdrachtgever	opdrg	0 days	Wed 13-1-21
21	Verificatie ontwerp UO	opdrg	10 days	Wed 27-1-21
22	accoord verrificatie opdrachtgever UO	opdrg	0 days	Tue 9-2-21
23	uiterste wijzigsdatum afwerking door opdrachtgever		20 days	Wed 10-2-21
24	uiterste wijzigsdatum buitenterrein door opdrachtgever		1 day	Wed 10-3-21
25	**Kwaliteitsplan uitvoering**	**Buko**	**1 day**	**Mon 8-2-21**
26				
27	Procedure omgevingsvergunning			Mon 18-5-20
28	Bouwanvraag 1e fase Welstand		1 day	Tue 24-11-20
29	bouwaanvraag	Buko	0 days	Mon 7-12-20
30	Doorlooptijd omgevingsvergunning	Gemee	40 days	Tue 8-12-20
31	Afgifte omgevingsvergunning.	gemeer	0 days	Tue 9-2-21
32	Bezwaartermijn	gemeer	23 days	Wed 10-2-21
33	Omgevingsvergunning onherroepenlijk	gemeer	0 days	Fri 12-3-21
34				
35	Productie		**20 days**	**Mon 15-3-21**
36	prefabricage onderdelen		20 days	Mon 15-3-21
37				
38	Uitvoering		247 days	Wed 23-12-20
39	opname belendingen?		1 day	Wed 23-12-20
40	overdracht bouwplaats		1 day	Wed 6-1-21
41	destructief asbest onderzoek.		10 days	Wed 6-1-21
42	afzetting locatie		2 days	Mon 18-1-21
43	sloop eerste fase		20 days	Wed 20-1-21
44	Sonderen ter controle		1 day	Mon 15-2-21
45	bouwplaatsinrichting		5 days	Thu 25-2-21
46	bouwstroom aansluiting op bs		1 day	Thu 4-3-21
47	uitzetten bouwput incl bouwraam		1 day?	Fri 5-3-21
48	Grondwerk		4 days	Mon 8-3-21
49	uitzetten heipalen		1 day	Fri 12-3-21
50	Heipalen		5 days	Mon 15-3-21
51	koppesnellen		7 days	Mon 22-3-21
52	Opschonen bouwput		2 days	Mon 22-3-21
53	Stellen PS kist		5 days	Wed 31-3-21
54	Stellen wapening		3 days	Thu 8-4-21
55	Storten fundering		3 days	Tue 13-4-21
56	aanvullen rondom funderin ontkisten		2 days	Fri 16-4-21
57	Ankers inboren		3 days	Fri 16-4-21
58	Bestellen betontrappen		0 days	Fri 12-2-21
59	Bestellen kanaalplaatvloeren		0 days	Tue 26-1-21
60	Leggen BGG vloer		2 days	Wed 21-4-21
61	Bestellen staalconstructie		0 days	Tue 26-1-21
62	staalkonstructie BGG		4 days	Fri 23-4-21
63	1e verdiepingvloer		2 days	Fri 30-4-21
64	ondersabelen staalconstructie		1 day	Tue 4-5-21
65	staalconstructie 1e verdieping		5 days	Tue 4-5-21
66	Betontrappen plaatsen		3 days	Tue 11-5-21
67	Dakvloer leggen		2 days	Mon 17-5-21
68	**Audit staalconstructie en vloeren**		0 days	Tue 18-5-21
69	dakrekken plaatsen		3 days	Wed 26-5-21
70	dakbedekking		5 days	Mon 31-5-21
71	Gevelelementen plaatsen		5 days	Wed 19-5-21
72	**audit casco gereed**		0 days	Fri 4-6-21
73	gebouw wind en waterdicht		0 days	Fri 4-6-21
74	aanvoeren hoogwerker		1 day	Wed 19-5-21
75	horizontaal en vertikale naden afwerken		7 days	Wed 26-5-21
76	Aanbrengen gevelbekleding		50 days	Fri 4-6-21
77	afstorten naden		2 days	Mon 7-6-21
78	vloerverwarming en wapening		6 days	Wed 9-6-21
79	druklagen storten bgg/verd		4 days	Thu 17-6-21
80	druklagen gereed		0 days	Tue 22-6-21
81	Binnenwanden MS		60 days	Wed 23-6-21
82	Binnenwanden gereed		0 days	Tue 5-10-21
83	binnenkozijnen plaatsen		11 days	Wed 6-10-21
84	Plateau lift		10 days	Wed 6-10-21
85	binnendeuren plaatsen		5 days	Thu 21-10-21
86	W installaties ruwbouw		80 days	Mon 7-6-21
87	**Audit installatie ruwbouw**		0 days	Fri 15-10-21
88	W-installatie afmontage		30 days	Mon 18-10-21
89	W-installatie inregelen		15 days	Fri 26-11-21
90	E installaties ruwbouw		80 days	Mon 7-6-21
91	E-installatie afmontage		30 days	Mon 18-10-21
92	E-installatie inregelen		15 days	Mon 29-11-21
93	Brandmeld en omroepinstallatie		15 days	Fri 26-11-21
94	Data installatie		15 days	Fri 26-11-21
95	NUTS voorzieningen aansluiten		3 days	Wed 6-10-21
96	plafond rasterwerk		25 days	Wed 6-10-21
97	plafond platen inleggen		12 days	Wed 10-11-21
98	Keukens plaatsen		5 days	Fri 26-11-21
99	gietvloeren		5 days	Fri 26-11-21
100	Wandtegelwerk		15 days	Thu 21-10-21
101	wandafwerking		25 days	Wed 10-11-21
102	vloerafwerking		10 days	Wed 15-12-21
103	plinten aanbrengen		8 days	Wed 15-12-21
104	kitten		3 days	Tue 4-1-22
105	Binnenschilderwerk		20 days	Wed 10-11-21
106	Werk gereed		0 days	Thu 6-1-22
107	Narooien		5 days	Fri 7-1-22
108	**Infra buiten**		**45 days**	**Fri 3-9-21**
109	Grondwerk		10 days	Fri 3-9-21
110	ondergronds Q-net		7 days	Fri 17-9-21
111	Aanbrengen verharding/keerwanden		20 days	Fri 17-9-21
112	aanbrengen hekwerken/poorten		5 days	Fri 15-10-21
113	tereininventaris/speeltoestellen		10 days	Fri 22-10-21
114	vooroplevering		2 days	Fri 7-1-22
115	opleverpunten		5 days	Tue 11-1-22
116	DEFINITIEVE OPLEVERING		0 days	Mon 17-1-22
117	Extra bouwtijd Grote gymzaal		15 days	Tue 18-1-22
118	Extra bouwtijd dorpshuis		30 days	Tue 18-1-22
119				
120	**Sloop tweede fase**		**50 days**	**Tue 15-2-22**
121	Destructief asbest onderzoek.		10 days	Tue 15-2-22
122	Sloop 2e fase		20 days	Tue 1-3-22
123	Realiseren parkeerplaatsen		20 days	Tue 29-3-22
124	Overdracht terrein aan gemeente		0 days	Mon 25-4-22

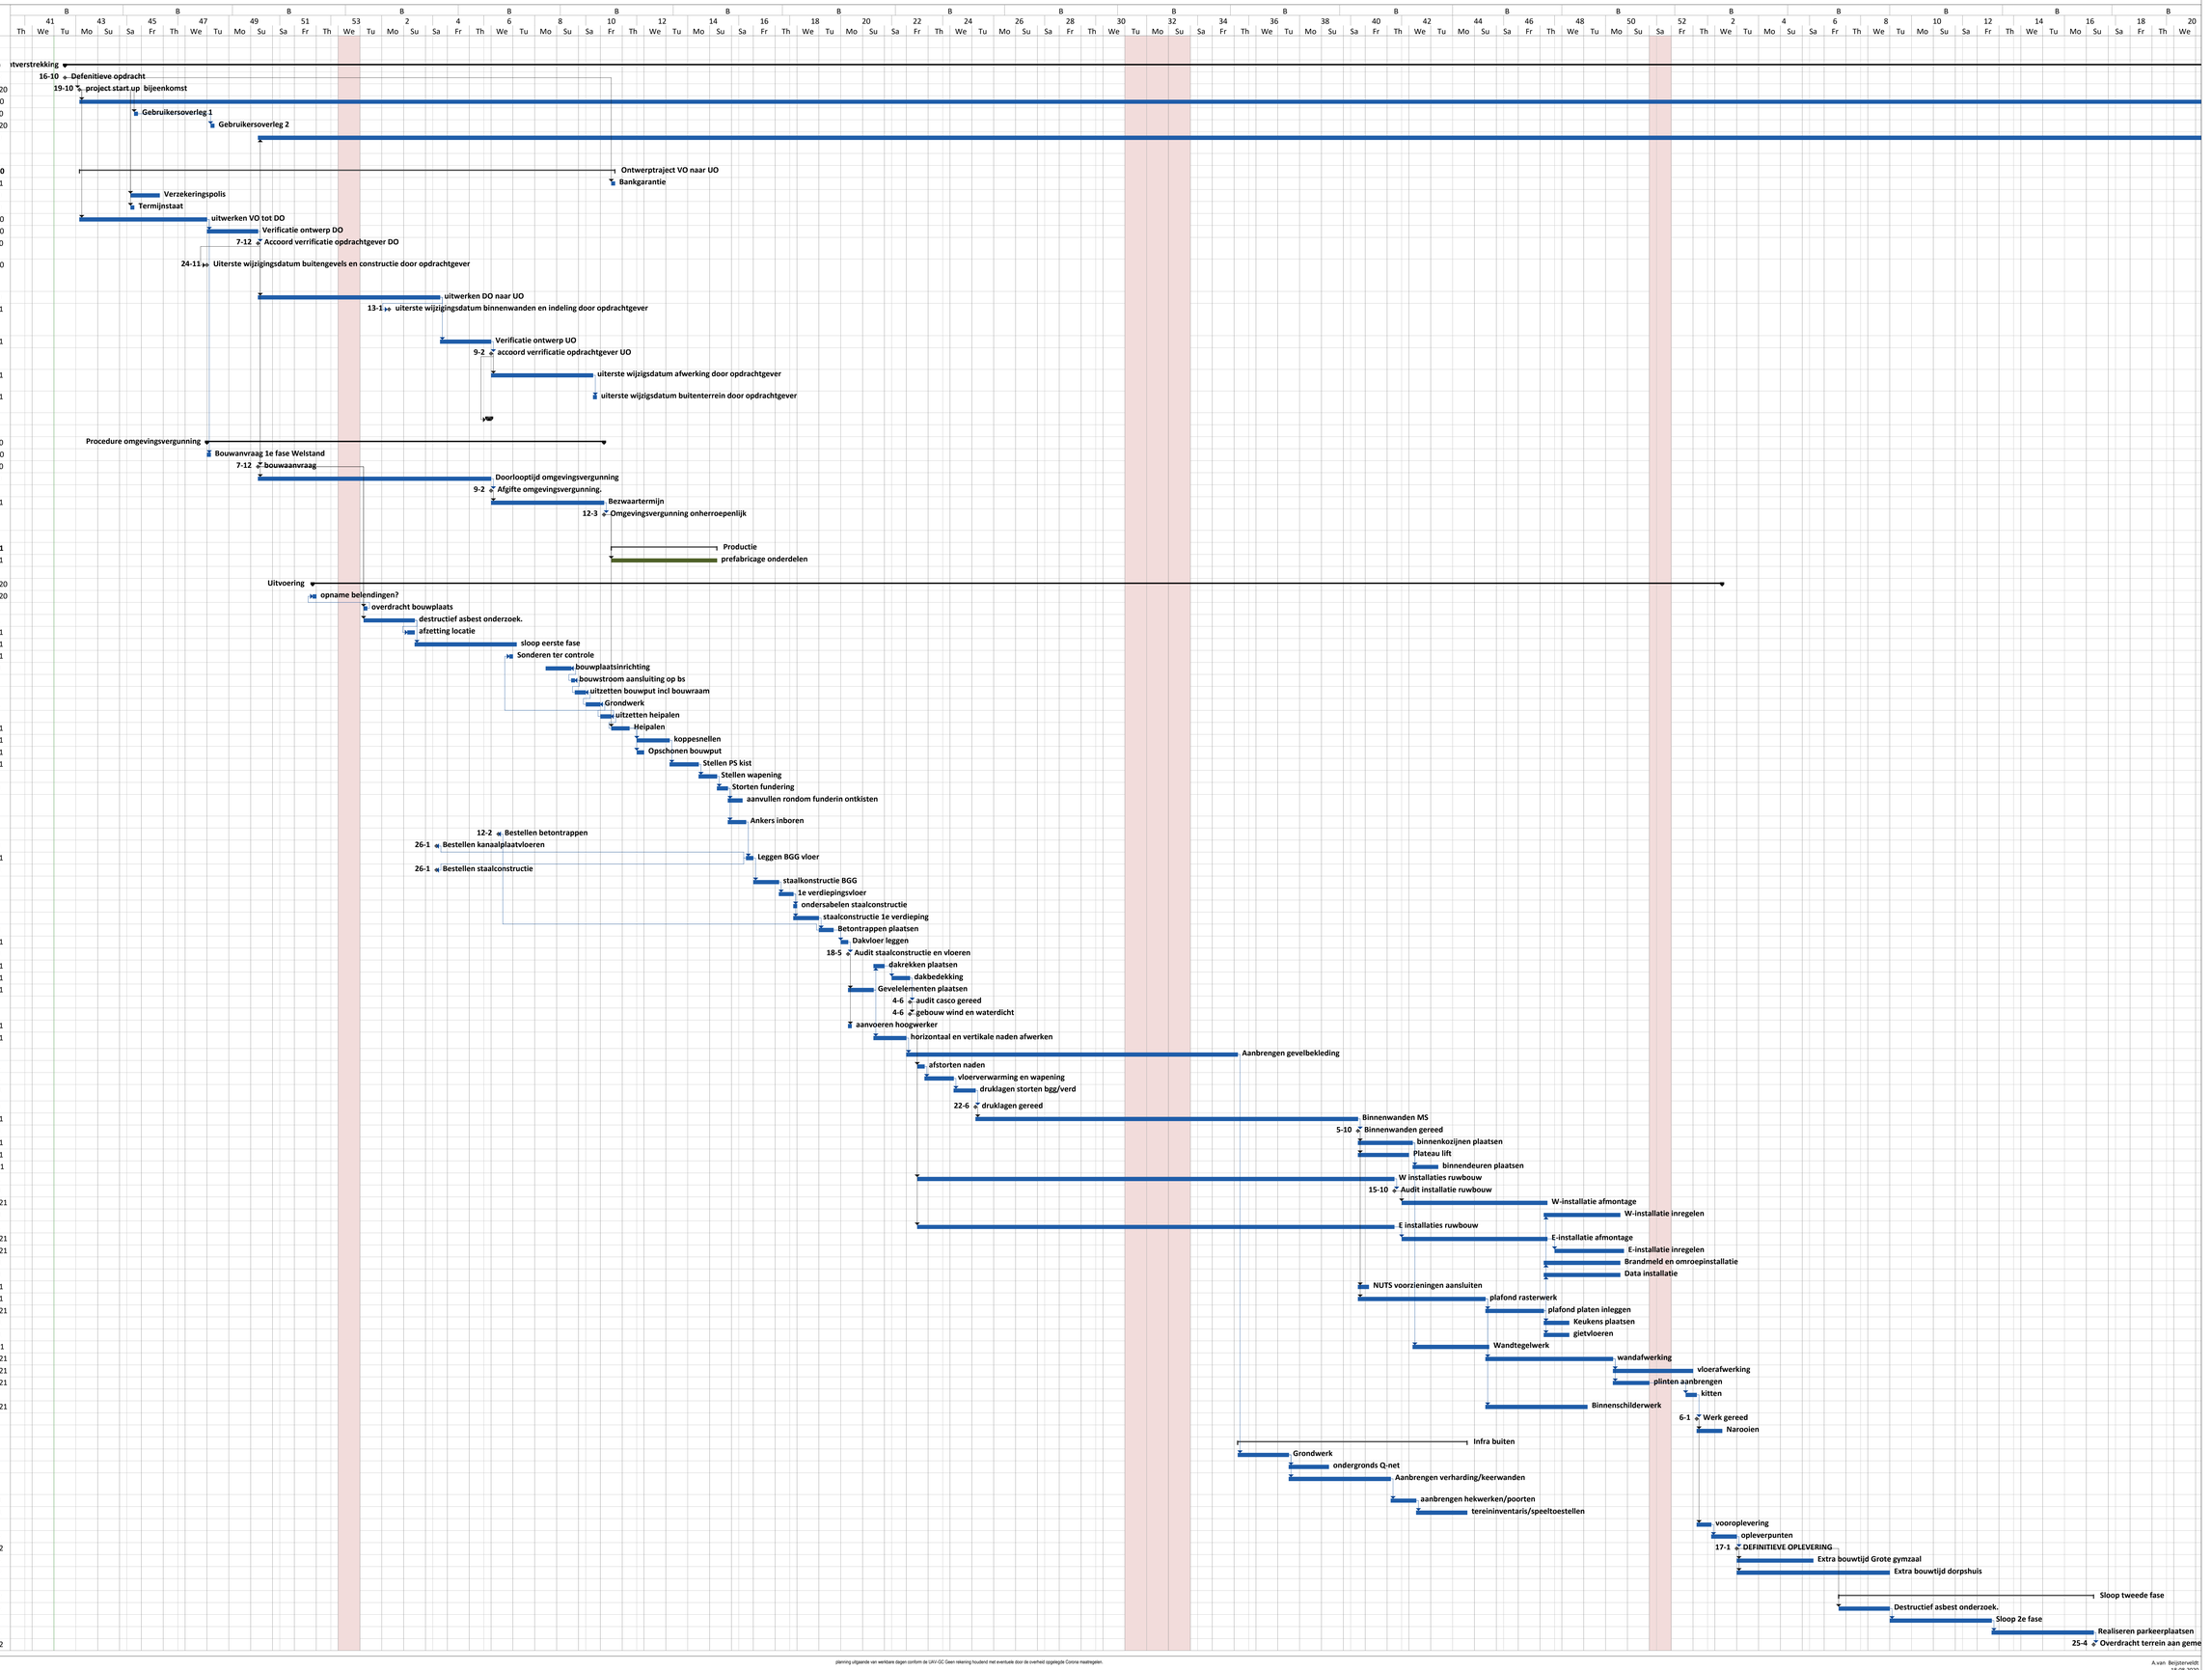
Th We Tu Mo Su Sa Fr Th We Tu Mo Su Sa Fr Th We Tu Mo Su Sa Fr
